



Ilustre Municipalidad  
de Buin

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**  
*Dirección de Obras Municipales*

**RESOLUCIÓN N° 411 /2022**  
**APLICA MULTA**

Buin, a 19 de diciembre de 2022

**VISTOS:**

- 1° Que, por medio del Decreto Alcaldicio N° 32, de 9 de febrero de 2022, la Ilustre Municipalidad de Buin aprobó las bases administrativas y técnicas, más anexos de la licitación pública denominada "Instalación Luminarias Led Parque El Diamante, Comuna Buin", identificada en el Sistema de Información de Mercado Público bajo el ID N° 2723-10-LP21.
- 2° Que, por medio del Decreto Alcaldicio N° 275, de 9 de diciembre de 2022, la Entidad Licitante adjudicó la licitación pública establecida precedentemente, al oferente Importadora y Exportadora Clever Ltda. RUT N° 77.327.630-7.
- 3° Que, por medio del Decreto TC N° 390, de 28 de noviembre de 2022, la Municipalidad aprobó el contrato suscrito con el adjudicatario, ya individualizado.
- 4° Que, mediante el Decreto TC N° 286, de fecha 9 de septiembre de 2022 se designó como Inspector Técnico de Obras, en adelante ITO, al funcionario señor Rodrigo Ortúzar Torres, con desempeño en la Dirección de Obras.

**CONSIDERANDO:**

- 1° Que, el punto 20.1, "Causales y Montos de Multas" Letra a) Por no colocación de letrero indicativo: Se aplicará una multa equivalente a 1 UTM, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo señalado en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas, situación que será consignada por el ITO en el Libro de Obras.
- 2° Que, con fecha 16.12.2022 se deja constancia mediante correo electrónico que Letrero no se ha instalado de acuerdo al plazo establecido en el punto 18.2 de las bases por lo que se cursaran las multas, de acuerdo al punto 20.1 letra a).
- 3° Que, con fecha 16.02.2022 se deja constancia mediante anotación en el Libro de Obras Folio 03, informando que no se ha realizado la instalación del Letrero y que se cursaran las multas, de acuerdo al punto 20.1 letra a).
- 4° Que, con fecha 19.02.2022 se deja constancia mediante anotación en el Libro de Obras Folio 04, informando que se recibe por correo la instalación de Letrero de obra, por lo que se cursaran las multas, de acuerdo al punto 20.1 letra a), por los 6 días de atrasos.
- 5° Las atribuciones que me confiere la ley.





Ilustre Municipalidad  
de Buin

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**  
*Dirección de Obras Municipales*


---

**RESUELVO:**

- 1° APLÍQUESE** multa equivalente a 6 U.T.M. por los 6 días de atraso en la instalación del Letrero de Obras.
- 2° NOTIFIQUESE** la presente resolución al adjudicatario, ya individualizado, personalmente o vía carta certificada, por parte del Director de Obras o del funcionario que este designe.
- 3° HÁGASE PRESENTE** al adjudicatario, que, en contra de la presente resolución cabe la interposición de un recurso de reposición con apelación en subsidio, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación.

**ANÓTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE**

*20/12/2022*

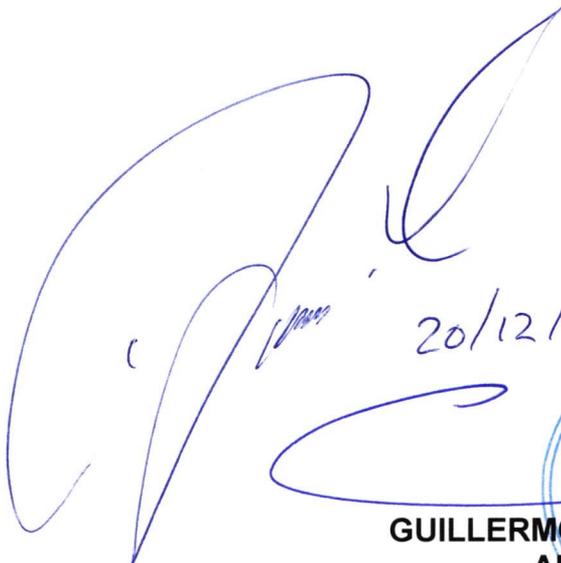

**GUILLERMO IBACACHE GÓMEZ**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

*MB*  
Distribución  
- Clever  
- Archivo DOM.  
- Secpla
